


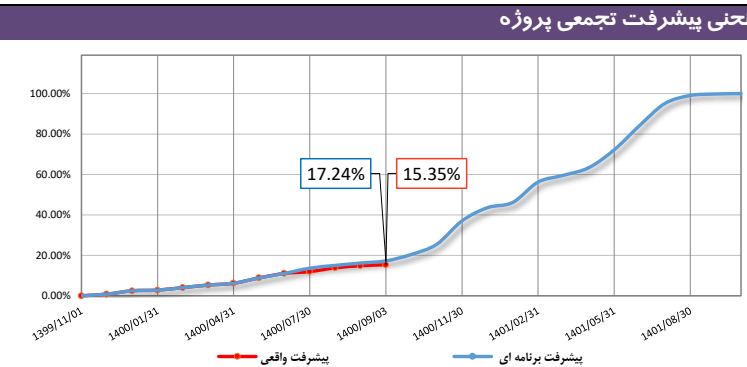

پیشنهادهای و راهکارها
با توجه به اینکه اجرای اسکلت در مسیر بحرانی پروژه قرارداد تاخیر در اجرای این جبهه باعث تاخیر در کل پروژه میشود لذا میبایست پیمانکار در صدد جبران تاخیرات ایجاد شده برآمده و در تاریخ مقرر طبق صورتجلسه اجرای این آیتم تکمیل گردد
وضعیت قراردادهای و تدارکات پروژه با توجه به شروع عملیات سفتکاری (تیغه چینی) در اول دی ماه عقد قرارداد با پیمانکار سفت کاری شروع عملیات تاسیسات مکانیکال در تاریخ ۲۵ دی ماه خرید متریال و عقد قرارداد با پیمانکار شروع عملیات تاسیسات الکتریکیال در تاریخ ۷ بهمن خرید متریال و عقد قرارداد با پیمانکار با توجه به نهایی شدن نقشه های موتورخانه و نوسان قیمت ها در صورت موافقت مدیریت خرید تجهیزات موتورخانه در دستور کار قرار گیرد. شروع اخذ استعلام شیرآلات بابت خرید مکانیزم های مربوطه و همچنین خرید فلاش تانک های توکار تعیین تکلیف درب های داخلی و ورودی به جهت دیتیل نصب

واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

وضعیت نیروی انسانی پروژه

[illegible]



گزارش هفتگی کنترل پروژه - پروژه مجتمع مسکونی دیباجی

شماره ۴- - منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

فعالیت های اجرایی پروژه طی هفته گذشته

[illegible]
